

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO A - PRAÇA DA CATEDRAL																											
OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO B - AV. TIRADENTES PRAÇA RENATO CELIDÔNIO																											
OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO G - VILA OLÍMPICA																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	30dias		60dias		90dias		120dias		150dias		180dias		210dias		240dias		270dias		300dias		330dias		360dias		VERIFICAÇÃO DO % TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
TRECHO A 300 DIAS CORRIDOS																											
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	516.459,18					85,00%	438.990,30									5,00%	25.822,96			5,00%	25.822,96	2,00%	10.329,18	3,00%	15.493,78	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	768.744,14					4,57%	35.154,68	7,01%	53.927,36	10,08%	77.474,56	9,65%	74.193,26	10,63%	81.680,37	11,59%	89.084,42	13,54%	104.122,56	15,28%	117.443,96	11,34%	87.210,39	6,30%	48.452,58	100,00%
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.330.665,26					20,00%	266.133,05	40,00%	532.266,10	40,00%	532.266,10															100,00%
4	LOCAÇÃO DA OBRA	28.200,85							50,00%	14.100,43	50,00%	14.100,43															100,00%
5	URBANIZAÇÃO	8.434.489,32					5,00%	421.724,47	10,00%	843.448,93	10,00%	843.448,93	15,00%	1.265.173,40	15,00%	1.265.173,40	15,00%	1.265.173,40	15,00%	1.265.173,40	15,00%	1.265.173,40	15,00%	1.265.173,40	5,00%	421.724,47	100,00%
6	DRENAGEM PLUVIAL	761.386,17							10,00%	76.138,62	10,00%	76.138,62	20,00%	152.277,23	20,00%	152.277,23	20,00%	152.277,23	20,00%	152.277,23	20,00%	152.277,23					100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	31.975,69									20,00%	6.395,14	20,00%	6.395,14	20,00%	6.395,14	20,00%	6.395,14	10,00%	3.197,57	10,00%	3.197,57					100,00%
8	REDE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES	346.237,33							10,00%	34.623,73	20,00%	69.247,47	15,00%	51.935,60	15,00%	51.935,60	10,00%	34.623,73	10,00%	34.623,73	10,00%	34.623,73	5,00%	17.311,87	5,00%	17.311,87	100,00%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	47.800,58									20,00%	9.560,12	20,00%	9.560,12	20,00%	9.560,12	10,00%	4.780,06	10,00%	4.780,06	5,00%	2.390,03	5,00%	2.390,03	10,00%	4.780,06	100,00%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	525.418,33																			40,00%	210.167,33	60,00%	315.251,00			100,00%
11	MOBILIÁRIO URBANO	700.140,05													15,00%	105.021,01	15,00%	105.021,01	15,00%	105.021,01	15,00%	105.021,01	20,00%	140.028,01	20,00%	140.028,01	100,00%
12	QUIOSQUES E COBERTURAS	225.767,14													20,00%	45.153,43	20,00%	45.153,43	20,00%	45.153,43	20,00%	45.153,43	10,00%	22.576,71	10,00%	22.576,71	100,00%
13	PAISAGISMO	1.858.741,04															5,00%	92.937,05	20,00%	371.748,21	30,00%	557.622,31	30,00%	557.622,31	15,00%	278.811,16	100,00%
14	FONTE INTERATIVA	518.403,83															10,00%	51.840,38	20,00%	103.680,77	20,00%	103.680,77	50,00%	259.201,92			100,00%
15	COMPLEMENTOS	93.583,01							3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	3,00%	2.807,49	76,00%	71.123,09	100,00%
PARCIAL DO PERÍODO - TRECHO A							4,57%	740.278,04	7,01%	1.135.588,20	10,08%	1.631.438,85	9,65%	1.562.342,24	10,63%	1.720.003,78	11,59%	1.875.916,30	13,54%	2.192.585,45	15,28%	2.473.103,98	11,34%	1.836.453,37	6,30%	1.020.301,71	
PARCIAL ACUMULADO - TRECHO A							4,57%	740.278,04	11,59%	1.875.866,23	21,67%	3.507.305,08	31,32%	5.069.647,32	41,94%	6.789.651,10	53,53%	8.665.567,40	67,08%	10.858.152,85	82,35%	13.331.256,83	93,70%	15.167.710,21	100,00%	16.188.011,92	100,0000%
TRECHO B 360 DIAS CORRIDOS																											
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	484.115,23	85,00%	411.497,95													5,00%	24.205,76			5,00%	24.205,76	2,00%	9.682,30	3,00%	14.523,46	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	995.236,29	4,20%	41.804,16	4,27%	42.447,61	5,40%	53.759,44	6,59%	65.569,09	13,10%	130.336,78	11,94%	118.850,80	11,91%	118.567,05	10,57%	105.194,12	7,41%	73.743,94	9,29%	92.466,21	8,57%	85.308,12	6,75%	67.188,98	100,00%
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.781.388,85	40,00%	712.555,54	30,00%	534.416,66	30,00%	534.416,66																			100,00%
4	LOCAÇÃO DA OBRA	27.860,79			70,00%	19.502,55	30,00%	8.358,24																			100,00%
5	URBANIZAÇÃO	13.522.816,19							5,00%	676.140,81	20,00%	2.704.563,24	20,00%	2.704.563,24	20,00%	2.704.563,24	15,00%	2.028.422,43	5,00%	676.140,81	5,00%	676.140,81	5,00%	676.140,81	5,00%	676.140,81	100,00%
6	DRENAGEM PLUVIAL	2.789.559,00			20,00%	557.911,80	30,00%	836.867,70	30,00%	836.867,70	20,00%	557.911,80															100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	76.515,36					10,00%	7.651,54	20,00%	15.303,07	10,00%	7.651,54	20,00%	15.303,07	10,00%	7.651,54	5,00%	3.825,77	5,00%	3.825,77	5,00%	3.825,77	5,00%	3.825,77	10,00%	7.651,54	100,00%
8	REDE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES	591.479,02			5,00%	29.573,95	10,00%	59.147,90	40,00%	236.591,61	10,00%	59.147,90	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	5,00%	29.573,95	100,00%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	235.581,75									20,00%	47.116,35	20,00%	47.116,35	20,00%	47.116,35	10,00%	23.558,18	10,00%	23.558,18	5,00%	11.779,09	5,00%	11.779,09	10,00%	23.558,18	100,00%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	942.493,45															20,00%	188.498,69	20,00%	188.498,69	30,00%	282.748,04	20,00%	188.498,69	10,00%	94.249,35	100,00%
11	MOBILIÁRIO URBANO	918.569,82									5,00%	45.928,49	15,00%	137.785,47	15,00%	137.785,47	10,00%	91.856,98	10,00%	91.856,98	15,00%	137.785,47	15,00%	137.785,47	15,00%	137.785,47	100,00%
12	QUIOSQUES, MARQUISES E REFORMA OBELISCO	1.782.440,49									5,00%	89.122,02	15,00%	267.366,07	15,00%	267.366,07	15,00%	267.366,07	15,00%	267.366,07	15,00%	267.366,07	10,00%	178.244,05	10,00%	178.244,05	100,00%
13	PAISAGISMO	3.522.637,64															5,00%	176.131,88	20,00%	704.527,53	30,00%	1.056.791,29	30,00%	1.056.791,29	15,00%	528.395,65	100,00%
14	COMPLEMENTOS	162.278,31	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	2,00%	3.245,57	5,00%	8.113,92	75,00%	121.708,73	100,00%
PARCIAL DO PERÍODO - TRECHO B			4,20%	1.169.103,21	4,27%	1.187.098,14	5,40%	1.503.447,04	6,59%	1.833.717,84	13,10%	3.645.023,68	11,94%	3.323.804,52	11,91%	3.315.869,24	10,57%	2.941.879,40	7,41%	2.062.337,49	9,29%	2.585.928,03	8,57%	2.385.743,46	6,75%	1.879.020,16	
PARCIAL ACUMULADO - TRECHO B			4,20%	1.169.103,21	8,47%	2.356.201,34	13,87%	3.859.648,38	20,46%	5.693.366,22	33,55%	9.338.389,91	45,49%	12.662.194,43	57,41%	15.978.063,66	67,98%	18.919.943,07	75,39%	20.982.280,55	84,68%	23.568.208,58	93,25%	25.953.952,03	100,00%	27.832.972,19	100,0000%
TRECHO G 180 DIAS CORRIDOS																											
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	154.783,56	85,00%	131.566,03					5,00%	7.739,18	5,00%	7.739,18	5,00%	7.739,18													100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	342.652,31	5,10%	17.486,32	11,49%	39.373,81	19,50%	66.807,82	27,57%	94.452,42	27,15%	93.025,96	9,19%	31.505,98													100,00%
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	409.181,40	40,00%	163.672,56	50,00%	204.590,70	10,00%	40.918,14																			100,00%
4	LOCAÇÃO DA OBRA E CADASTRO	10.062,11	20,00%	2.012,42	70,00%	7.043,48	10,00%	1.006,21								</											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Superintendência da Secretaria de Obras Públicas
Diretoria de Projetos de Obras Públicas
Av. XV de Novembro, 701, 3º Andar - Bairro Zona 01, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1475 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00114069/2023.53


À CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

Ao Vereador Sidnei Telles

Em atenção ao Requerimento 1440 (SEI nº 2544066) temos a informar:

1. Segue cronograma detalhado da obra do Eixo Monumental referente aos trechos A (Praça da Catedral), B (Praça Renato Celidônio) e G (Calçadas Vila Olímpica): Anexo 18_Cronogramaassinado (SEI nº 2607092).

2. A praça em questão faz parte do trecho D, conforme mapa esquemático abaixo, portanto não faz parte do escopo da Concorrência nº 025/2023-PMM.

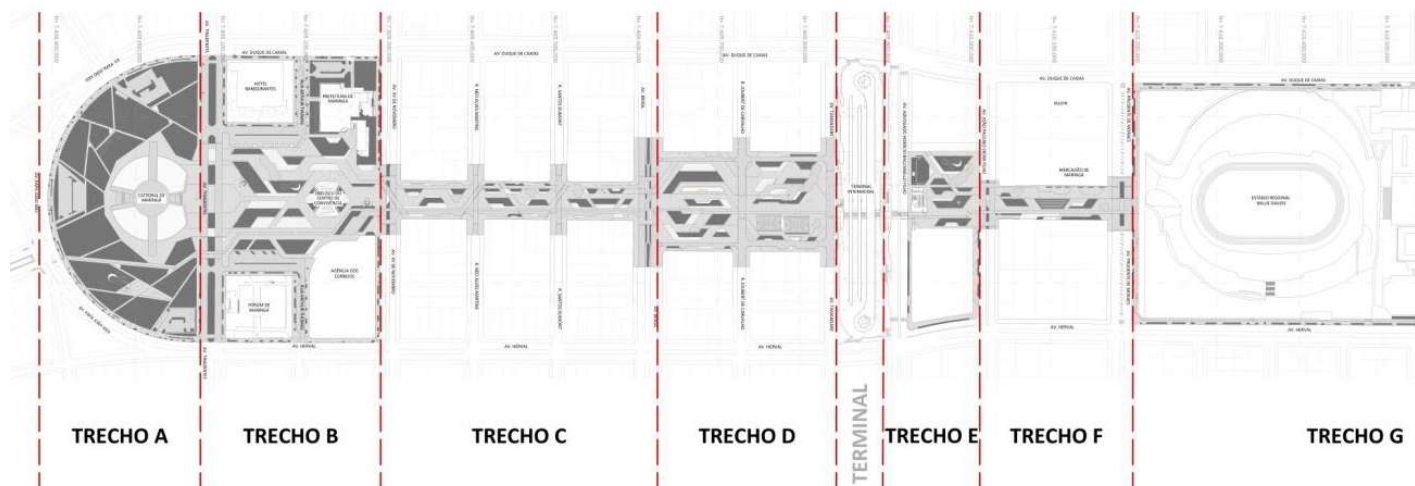

Os demais trechos da requalificação do Eixo Monumental (C,D,E e F) estão em fase de revisão de projetos e elaboração de orçamento pela empresa ganhadora do concurso público.

Ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Kamila Ferreira Lima, Diretor (a) de Projetos de Obras Públicas**, em 19/10/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joclei Terezinha Tozetto Menon, Secretário (a) de Obras Públicas**, em 19/10/2023, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2592396** e o código CRC **956DBD92**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3287/2023 - GAPRE

Maringá, 24 de outubro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1440/2023 (SEI nº 2544066), apresentado pelo Vereador **Sidnei Oliveira Telles Filho**, que solicita para fins de esclarecimento público, relativamente ao Projeto do Eixo Monumental, o quanto segue:

1 – se há possibilidade de enviar um cronograma detalhado da obra a ser licitada, incluindo datas previstas e os trechos a serem licitados, organizados em ordem sequencial;

2 – dado o preocupante estado de conservação da Praça Raposo Tavares, se seria possível priorizar a revitalização do Eixo Monumental começando pela área onde tal praça está situada.

Respondendo ao nobre parlamentar, anexamos o Despacho DPOP (SEI nº 2592396) e Anexo 18_Cronogramaassinado (SEI nº 2607092) disponibilizados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 24/10/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2628354** e o código CRC **11B11091**.
